

MODELAGEM INFORMACIONAL

Gestão de Projetos



Gestão básica de projetos

Gestão de Projetos, *um mundo a parte*



Cada projeto pode ter uma metodologia que seja mais adequada

Para um projeto de longo prazo, de longas interações, o PMI pode ser interessante. E.g. construir um navio.

Para desenvolvimento de software e interações mais curtas, o Agile pode ser melhor.

Assim como o padrão UML, o SQL, o TCP/IP, etc, existem associações destinadas a tratar padrões de projeto, que são subordinados a determinados princípios, tais como PMI – Project Management Institute, BJSS, Cprime, FAST Agile, Kanban, LeSS, ScALeD, Scaled Agile, Scrum Inc, etc.



Abertura para gestão híbrida e customizações

A depender do tamanho do projeto, das necessidades de visão gerencial, e do público executor, uma mesma empresa pode usar várias metodologias para projetos distintos.



Para o mundo corporativo ou para Web?

Empresas que possuem estruturas com várias equipes trabalhando juntas para um único produto. PMI.

Várias equipes de várias empresas trabalhando em vários projetos podem funcionar melhor com kanban.

Definição de Projeto

Um projeto é formado por um esforço, não-permanente, ou seja, temporário, para a criação de um produto ou serviço.

Como não é permanente, podemos afirmar que todo projeto deve conter início, desenvolvimento e fim definido.

Quando acabou o seu prazo no eclass

O projeto é finalizado quando:

Objetivos foram alcançados

Não é mais necessário

Objetivos não poderão ser atingidos

Não é compensador ir para frente

Importância

Trabalhar
em equipe



A tarefa central do Gerenciamento de projetos sempre foi a combinação do trabalho de diferentes pessoas para a execução de tarefas que seriam úteis para os clientes ou organizações.



Existe um núcleo central de conceitos e processos que é compartilhado pela maioria dos projetos

Características



Temporário não é sinônimo de curta duração.



Necessário pensar a respeito da natureza temporária dos projetos e que a oportunidade do mercado do projeto normalmente é temporária.

O seu
prazo no
eclaxs



O projeto tem que ficar pronto num prazo limitado, caso contrário o produto resultante dele não terá mais validade ou viabilidade comercial (*time to market*)

Um passo
de cada
vez




Elaboração progressiva: possibilita desenvolvimento em etapas incrementais.

Um navio, um prédio, um sistema

Alguns podem pensar que a elaboração de um sistema não exija um projeto formal, afinal, se o sistema não funcionar como esperado seria apenas o trabalho de apagar tudo e criar de novo.

***Engana-se** quem pensa assim, o retrabalho ocasionado pela falta de planejamento é muito caro para a empresa, além de ser altamente frustrante para os profissionais envolvidos.*



Quando estiver projetando um sistema, um banco de dados, um Data Lake, encare essa tarefa com a mesma seriedade de alguém que irá projetar um navio ou um prédio.

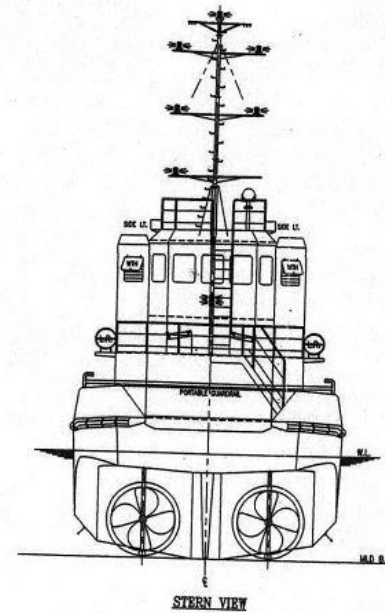



PRINCIPAL PARTICULARS :-	
L.O.A	30.000M (98.425FT)
L.B.P.	27.733M (90.988FT)
BREATHD MLD	8.600M (28.215FT)
DEPTH MLD	4.120M (13.517FT)
DESIGNED DRAFT	3.500M (11.483FT)
SPEED	ABT 11 KNOTS
COMPLEMENT	10 MEN
F.O. CAPACITY	196 TONS (APPROX.)
F.W. CAPACITY	73 TONS (APPROX.)
B.W. CAPACITY	40 TONS (APPROX.)
MAIN ENGINE	MITSUBISHI S6R2-MTK3L 759KW@1406RPM X 2 UNITS
GEAR BOX	WAF562L RATIO 5.05:1
GENERATOR	78KW X 2 NOS
NAVIGATION AREA	INTERNATIONAL 
PORT OF REGISTRY	KOTA KINABALLU
FLAG	MALAYSIA

[NK] L by NK Rules: 28.064 m

[NK] da : 2.500 m

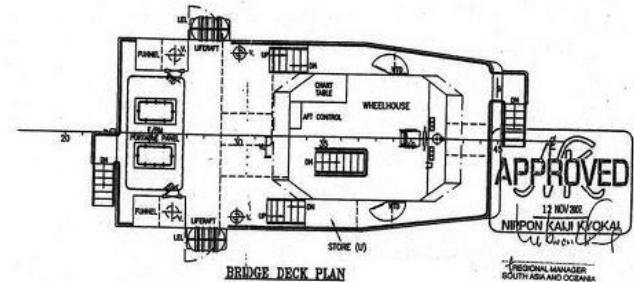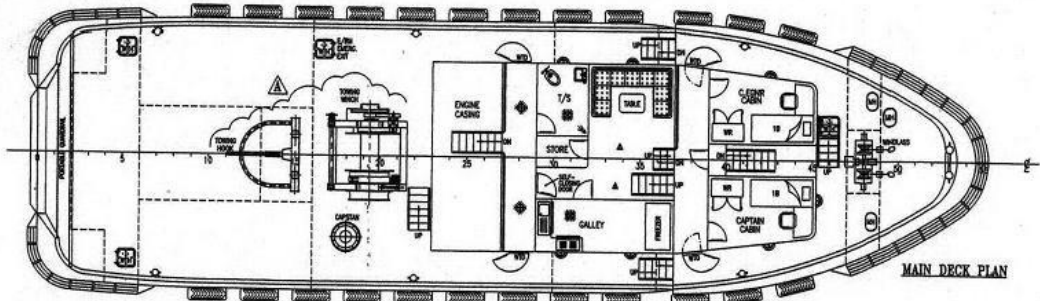






(NK) With Remarks in Red

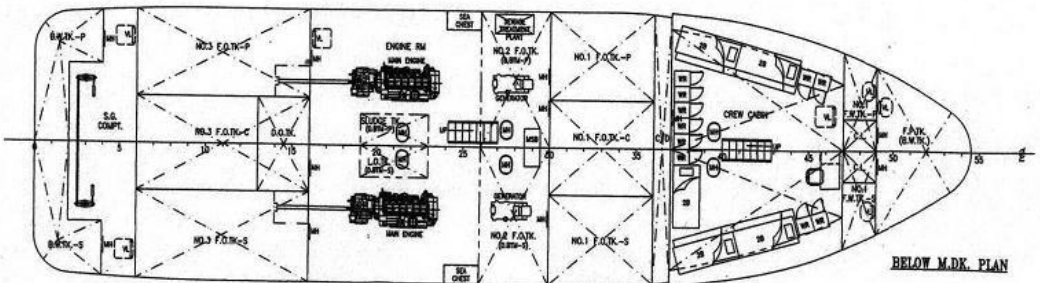

DATE	MODIFICATION		REV	BY
SHIP				
30M TWIN SCREW TUG				
TITLE				
GENERAL ARRANGEMENT				
OWNER				
BUILDER				
CLASS	NK			
DESIGN	CHECKED	APPROVED	SCALE	DRAWING NO.
			1 : 75	

1. Caixa-d'água potável
2. Reservatório reúso
3. Caixa-d'água chuva + hidrante
4. Barrilete e casa de bomba para hidrantes

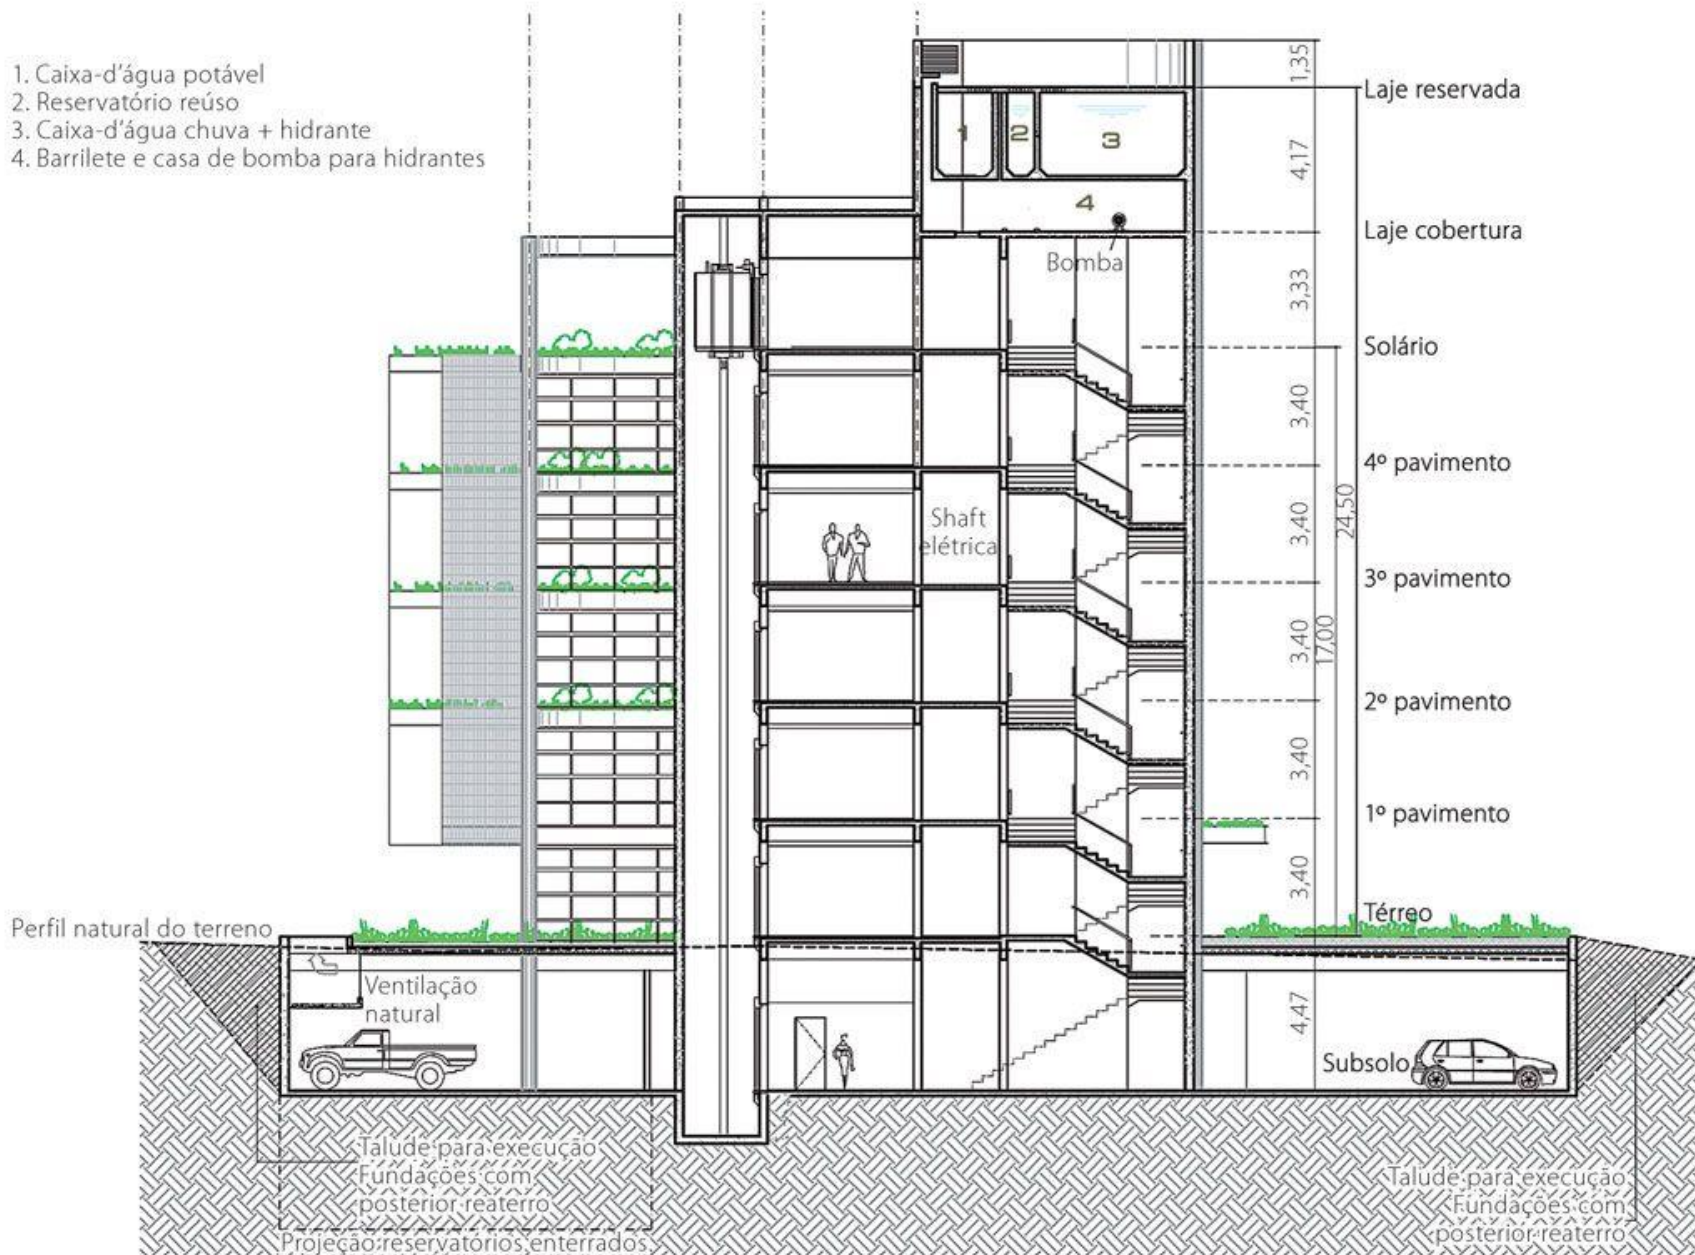

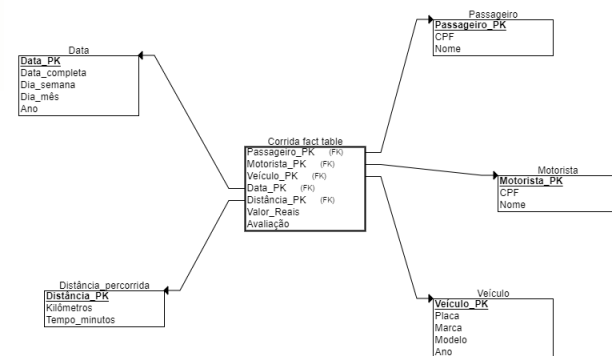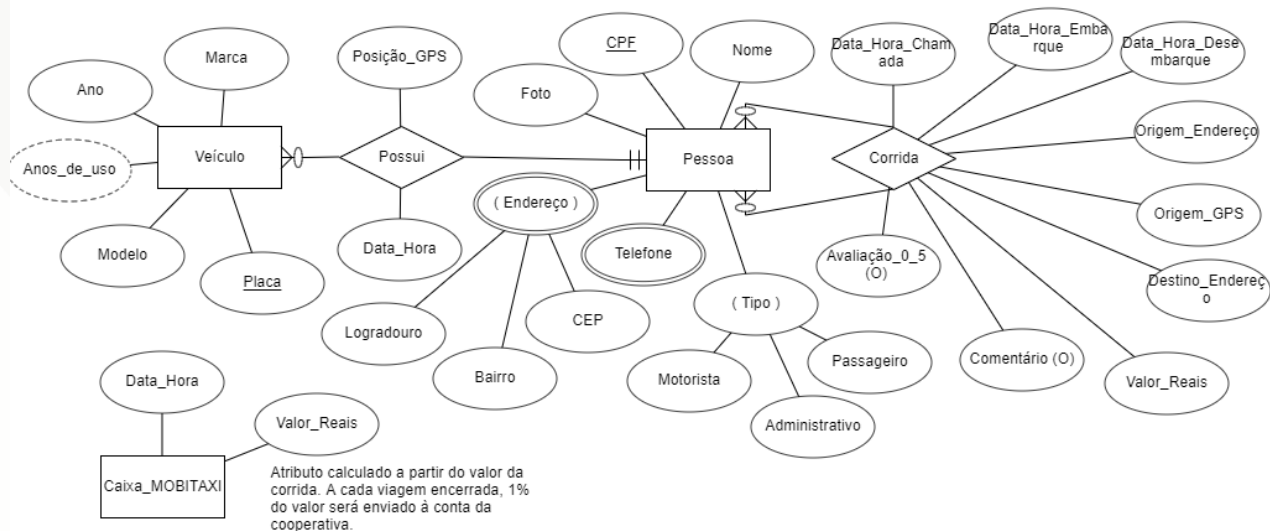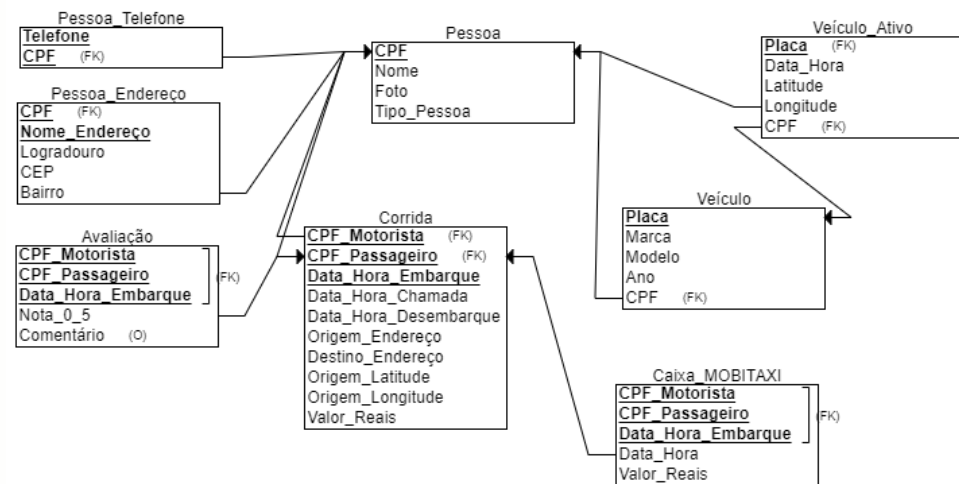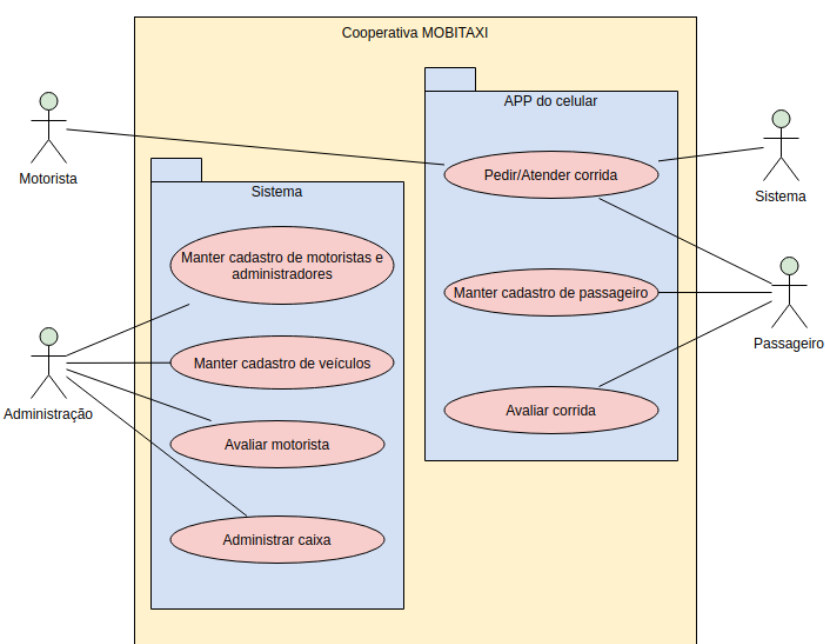

O que é gerenciamento de projetos?

Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender as suas demandas, sendo realizado por meio da integração dos seguintes processos:

Iniciação


Planejamento

Execução,

Monitoramento e controle

Encerramento


GERENTE DE PROJETO (VOCÊ)



Cada grupo
precisa de um
líder

- *O gerente de projeto deve:*
 - *Identificar necessidades do projeto*
 - *Estabelecer objetivos claros e palpáveis*
 - *Atender às expectativas das partes interessadas*
 - *Equilibrar qualidade, escopo, tempo e custo, que é realizado obedecendo-se à chamada teoria da tripla restrição*

TRIPLA RESTRIÇÃO

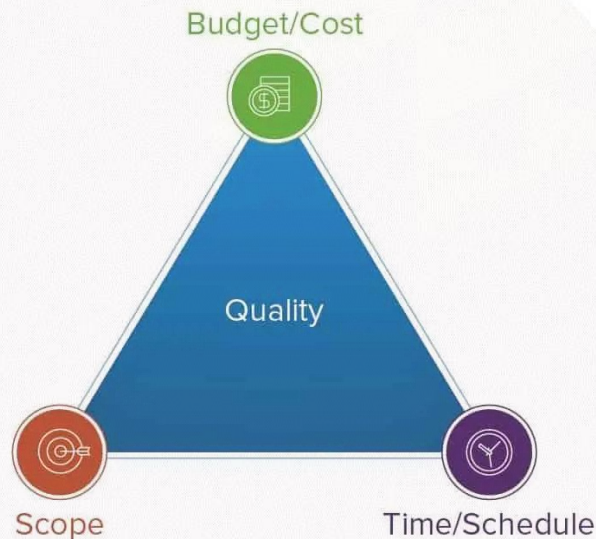

- *O triângulo de ferro do gerenciamento de projetos*
 - Orçamento fixo (budget)
 - **Imagine a #esforço em horas**
 - Cronograma fixo (prazo)
 - Expectativa de entregas
- *Uma interferência em qualquer aresta vai afetar a qualidade de entrega do seu projeto*

RESPONSABILIDADES PELO PROCESSO



Esta Foto de Autor
Desconhecido está licenciado
em [CC BY-SA-NC](#)

- *Identificar e resolver incidentes do projeto.*
- *Disseminar proativamente as informações do projeto a todas as partes interessadas (isto é, não esperar ser perguntado, **não deixar para o último dia**).*
- *Identificar, gerenciar e atenuar os riscos do projeto (buscar solução com a equipe, se não der, procurar o professor).*
- *Assegurar uma solução com uma qualidade aceitável. Gerenciar proativamente o **escopo** para garantir que somente o que foi acordado seja entregue, a menos que as mudanças sejam aprovadas através do gerenciamento do Escopo.*
- *Controlar o plano de trabalho (tarefas, responsáveis, prazos e orçamento).*
- *Definir e coletar métricas para saber como o projeto está andando.*


RESPONSABILIDADE PELAS PESSOAS ENVOLVIDAS



Podemos contar com pessoas conhecidas no grupo, mas trabalhar em equipe com um foco comum é bem mais do que isso.

- *Estabelecer habilidades de liderança para fazer com que a equipe siga as suas instruções. **Liderança significa comunicar uma visão e fazer com que a equipe a aceite e lute para chegar lá com você.***
- *Ter disciplina e capacidade de gerenciamento geral, para certificar-se de que as pessoas sigam os processos.*
- *Estabelecer expectativas razoáveis, desafiadoras e claras para as pessoas, e fazer com que elas se sintam responsáveis pelo atendimento das expectativas. Isto inclui fornecer um bom feedback sobre o desempenho aos integrantes da equipe.*
- *Habilidades para **criação de uma equipe**, de modo que as pessoas trabalhem em conjunto, e se sintam motivadas para trabalharem duramente pela causa do projeto e pelos outros integrantes da equipe. Quanto maior for sua equipe, e mais longo o projeto, mais importante é ter boas habilidades para criar uma equipe.*
- *Habilidades verbais e escritas de comunicador, incluindo a habilidade de escutar (temos uma boca e dois ouvidos - precisamos escutar mais).*

Chefe vs líder

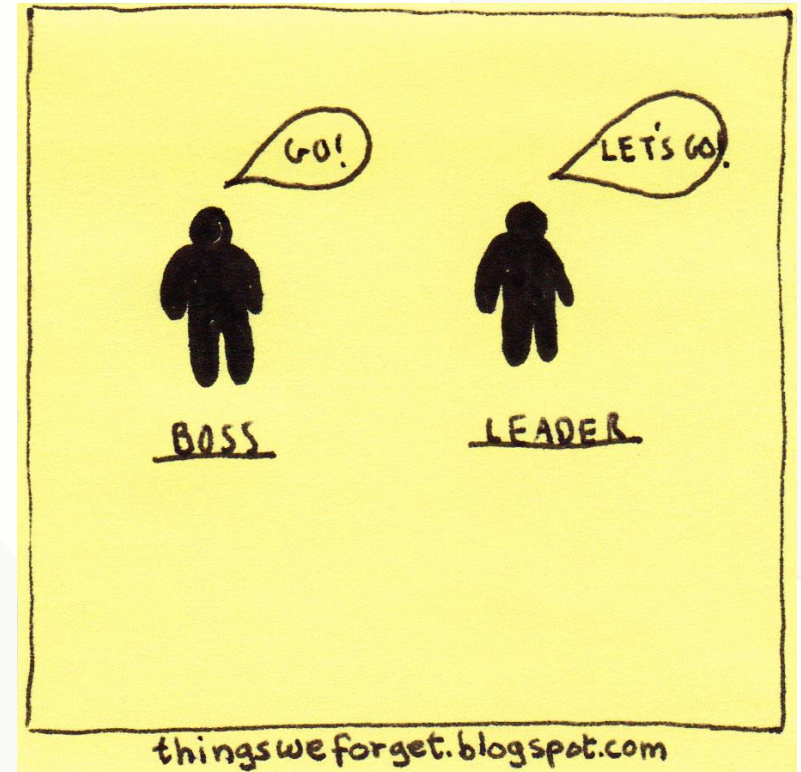

A equipe



Scrum

"A palavra se refere ao grupo de atacantes no rugby, que enfatiza o trabalho criativo e adaptável na resolução de problemas complexos."

Modelo de trabalho em equipe onde o time responde às adversidades de forma dinâmica e unida. Uma pessoa que não participa afeta o grupo todo.

Status do seu projeto via um simples Excel

	Atividades	Quem	Status	Data início	Data fim	OBS
	Disponibilização de Base de dados Registros de Vacinação COVID19					
1	Trazer a base ao ambiente operacional da FGV (um único arquivo de 108GB)					
1.1	Criação de servidor temporário para Download	Júlio			26/09/2021	
1.2	Download, compressão e fragmentação da base	Júlio			27/09/2021	Storage Account TIC LAB na
1.3	Download e descompressão na cloud acadêmica RJ	Júlio			30/09/2021	
2	Disponibilização dos dados em banco de dados colunar, para agregações filtros de grandes volumes de dados					
2.1	Criação do grid Cassandra	Júlio			27/09/2021	
2.2	Carga no Cassandra	Júlio				
2.3	Plano B - Carga no vertica				15/09/2021	
3	Máquinas físicas de SP - instalar vertica community					
3.1	Servidor 01				15/12/2021	Aguardando visita no local para alterar a BIOS
3.2	Servidor 02				15/12/2021	Aguardando visita no local para alterar a BIOS
3.3	Servidor 03				15/12/2021	Aguardando visita no local para alterar a BIOS

STATUS



Em aguardo



Em andamento



Concluída



Atenção



Parado



Cancelado

OKR - Objetivo e Resultados-Chave

Técnica administrativa estabelecida por um executivo da intel, que destacou a empresa frente a concorrência no mercado de microprocessadores na década de 80 e impulsionou o início do Google no final da década de 90.

O que fazer? de forma mensurável

Direcionamento

OBJETIVO CORPORATIVO DA INTEL
Estabelecer o 8086 como a família de microprocessadores de 16 bits de maior desempenho conforme a medição dos:

Resultados-Chave (2º trimestre de 1980)

1. Desenvolver e publicar 5 benchmarks capazes de mostrar um desempenho em nível excepcional do 8086 (aplicativos).
2. Trocar a embalagem de toda a família de produtos 8086 (Marketing).
3. Começar a produção da peça de 8MHz (Engenharia, fabricação).
4. Amostrar o coprocessador aritmético até 15 de junho (Engenharia).

Ferramenta de Gestão de Projetos

Use o que estiver ao seu alcance. Se não tiver nada, use um Excel.

O mais importante é manter o seu status sempre atualizado através de reuniões frequentes com as equipes.

Você precisa estar apto a relatar a evolução do projeto através de evidências registradas no relatório de status.

Para gestão dos OKRs, pode-se usar a [perdoo.com](https://www.perdoo.com).

Para lista de TODO, pode-se usar a todoist.com.

Erros comuns no gerenciamento de projetos

Participação desigual entre os membros do grupo

Não-entendimento do alinhamento do projeto com a organização.

Falta de gerenciamento das expectativas das partes interessadas em relação ao projeto.

Deixar as atividades para a última hora

Falta de acordo das partes interessadas em relação aos fatores de sucesso do projeto.

Falta de cronograma realista (prever quantidade de trabalho, dependências obrigatórias, estimativa de custo (horas) e nivelamento de recursos).



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-SA](#)

Definição e comunicação sobre as responsabilidades da equipe do projeto.

Falta de aceitação formal do cronograma do projeto.

Identificação preliminar de riscos.

Falta de definição de escopo.




Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...




Como o analista projetou...




Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...




Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Operação “tapa buraco”

De acordo com a prefeitura, o encarregado de asfalto da Operação Tapa-Buraco que estava acontecendo no local foi afastado das funções [#BandRio](#)





